

Dashboard de Control de Obra

Proyecto: Residencial Torres del Parque

Tema	Diseño de dashboard mediante tablas dinámicas y analítica de datos
Docente	Christian Anthony Arce Villanueva
Herramienta	Microsoft Excel
Aplicación	Control de avance, costos y actividades de una obra

Integrantes

- Orellana Retamozo Angel Gabriel - U24241054
- Candelario Arce Dalexandro DelPiero - U24252518
- Oscata Medina Juan Carlos - U24214778
- Fabrizio Samuel Sumiri Serrano - U2321408016

Lima - Perú | 2026

1. Objetivo

Diseñar un dashboard básico para controlar una obra de edificación mediante una base de datos de actividades y tablas de resumen dinámico. El tablero permite analizar avance físico, presupuesto, costo ejecutado, estados de las actividades y desempeño por fase.

2. Indicadores principales


Indicador	Resultado
Avance ejecutado	61.8 %
Presupuesto total	S/ 2,114,069
Costo ejecutado	S/ 1,306,523
Actividades retrasadas	2
Actividades totales	120

3. Tablas dinámicas y segmentación

La base contiene 120 actividades clasificadas por fase, sector, responsable y estado. A partir de ella se generan resúmenes por estado, fase y responsable. El dashboard incorpora controles de segmentación para Estado, Fase, Responsable y Sector, con el fin de facilitar la revisión de grupos específicos de actividades.

4. Dashboard desarrollado

Vista general del tablero elaborado en Excel:

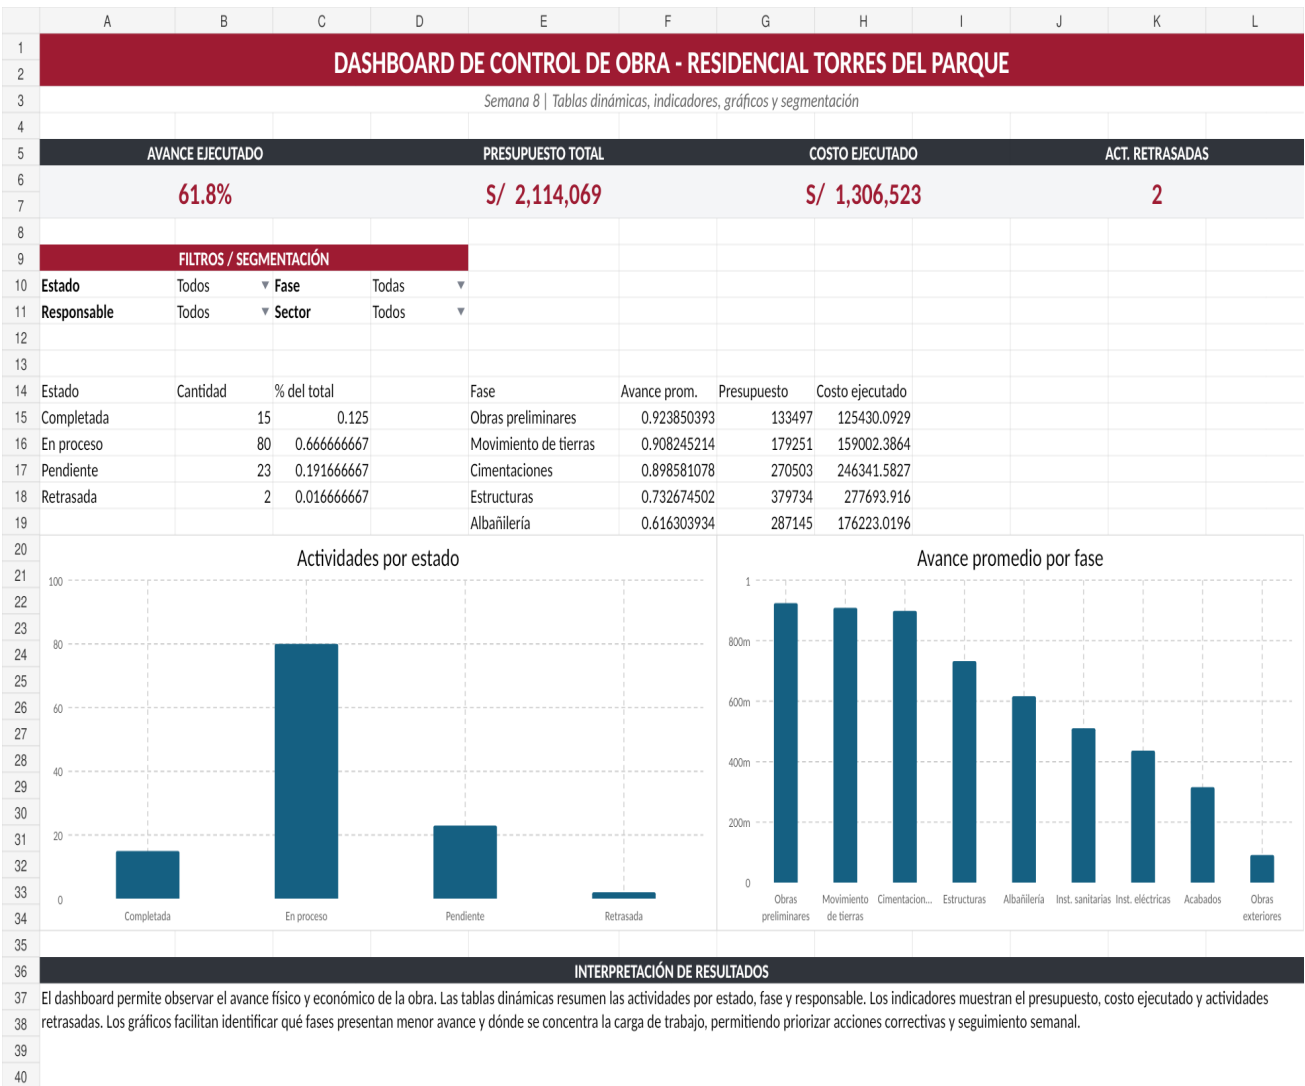

El archivo Excel adjunto conserva la base de datos, los resúmenes, los filtros y los gráficos utilizados para construir esta vista.

5. Interpretación de los resultados

El proyecto registra un avance físico ponderado aproximado de **61.8 %**. El costo ejecutado es de **S/ 1.31 millones** frente a un presupuesto de **S/ 2.11 millones**, por lo que el gasto acumulado mantiene relación con el nivel de avance general.

La mayor cantidad de actividades se encuentra **en proceso**. Por fases, las obras preliminares, movimiento de tierras y cimentaciones presentan los mayores niveles de avance, mientras que acabados y obras exteriores todavía muestran un progreso menor, coherente con una etapa posterior del proyecto.

Los gráficos permiten identificar rápidamente la distribución de actividades por estado y comparar el avance promedio entre fases. La segmentación por responsable, sector, fase y estado facilita localizar actividades específicas y realizar seguimiento a posibles retrasos.

6. Conclusiones

1. Las tablas dinámicas permiten resumir una base extensa de actividades y convertirla en información útil para la toma de decisiones.
2. El dashboard integra indicadores de avance, presupuesto, costo y retrasos en una sola vista.
3. Los gráficos ayudan a detectar las fases con menor progreso y los estados que concentran mayor cantidad de actividades.
4. Los filtros o segmentadores facilitan el análisis por responsable, sector, fase y estado.
5. El tablero puede emplearse como herramienta de seguimiento semanal para controlar el desempeño físico y económico de una obra.

7. Guion breve para exponer

“Nuestro dashboard corresponde al proyecto Residencial Torres del Parque. La información parte de una base de 120 actividades y se resume mediante tablas dinámicas. En la parte superior mostramos los indicadores principales: avance ejecutado, presupuesto, costo y actividades retrasadas. Luego utilizamos dos gráficos para analizar los estados de las actividades y el avance por fase. También incorporamos segmentación por estado, fase, responsable y sector. Con este dashboard podemos detectar dónde existe menor avance y realizar un mejor control de la obra.”
